RAKENNUSTEEMA

Tuntui, että ollaan voiton puolella, kun lietesäiliön yli sadan kuution valut saatiin kuntoon. **NAVETTAA RAKENTAVAT KATRI JA KAI LAULUMAA, OULAINEN**

Navettatyömaalla kiritään alkukesän viiveitä kiinni

ARI ROININEN

Oulaislaisten Katri ja Kai Laulumaan uusi navetta valmistuu syyskuun loppuun mennessä kutakuinkin aikataulussa. Pari viikkoa sitten valmistauduttiin ikkunoiden asentamiseen.

OULAINEN (MT)
Paljon on saatu aikaan, mutta paljon on vielä tekemistä varsinkin, kun syksy painaa päälle, miettivät uutta navettaa Oulaisiin rakentavat **Katri** ja **Kai Laulumaa**. Avajaiset on sovittu vajaan kuukauden päähän.

Tiukka takaraja on toisaalta hyvä, sillä eläimet pitää saada sisälle viimeistään lokakuun alussa, isäntäpari miettii. Laulumaat ovat lisänneet karjaa ostamalla eläimiä naapurilta. Jos aikataulussa ei pysytä, naapuri on luvannut joustaa.

”Toivottavasti syksy on lämmin ja kuiva.”

Maaseudun Tulevaisuus on seurannut Laulumaiden navettahanketta talvesta saakka. Hanke on MTK:n tyyppinavettahankkeen ensimmäinen kohde. Toista navettaa rakennetaan Hämeessä. Se valmistuu kuukautta Laulumaiden navettaa myöhemmin.

Viime viikolla saatiin valut valmiiksi, kun lypsyaseman lattia sai pinnan. Ovet saatiin paikalleen alkuviikolla, sen jälkeen asennetaan ikkunoita ja parrenerottimia. Ulkoseinien viimeistelykin on vielä kesken.

Työmäärä ei yllättänyt

Kai Laulumaan mukaan isoja yllätyksiä ei ole tullut eikä työmäärä yllättänyt. Aiemmista rakennuskohteista on opittu, ettei mikään tule itsestään valmiiksi. Pitkiä työpäiviä on tehty, mutta työpäiviä ei ole venytetty väkisin.

”Syvään kuitenkin huokaan, kun navetta saadaan valmiiksi.”

Pientä viilaamista toki aina tulee. Päätyjen villoittamiseen ja laudoittamiseen on mennyt yllättävän paljon aikaa, kun työ tehdään nostimella 7 metrin korkeudessa. Päädyissä on pinta-alaa enemmän kuin omakotitalossa.

Lietesäiliötä nostettiin hieman ylemmäs, jotta kalliota ei tarvinnut räjäyttää alta.

Lietesäiliön pystyttämisessä elettiin kriittisiä hetkiä. Oulun eteläpuolella satoi rankasti juuri, kun säiliön elementit oli saatu pystyyn. ”Parissa päivässä satoi yli sata milliä. Seurasin ikkunasta, vieläkö ovat pystyssä. Pohjalle kertyi yli puoli metriä vettä.”

Vahinkoja ei tullut. Elementit pystytettiin kalliomurskeen päälle ja murske sieti vettymistä. Sorapohja olisi pettänyt ja säiliö olisi jouduttu kokoamaan uudelleen, isäntä miettii.

”Tuntui, että ollaan voiton puolella, kun lietesäiliön yli sadan kuution valut saatiin kuntoon.”

Katto päälle viime tipassa

Laulumaat toivoivat alunperin, että navettaan olisi saatu katto päälle juhannukseksi. Siihen ei ylletty, vaan katto valmistui vasta kolme viikkoa myöhemmin.

Seinäelementit tehtiin talvella ja ne oli pakko asentaa paikalleen ennen katon tekoa. Pientä sovittamista tarvittiin, sillä elementit olivat aavistuksen liian korkeita. Siitäkin selvittiin.

Katto saatiin päälle ennen kovia sateita. Mikään ei kastunut eikä sateista ole lopulta ollut sanottavaa haittaa työmaalla. Jos sateet olisivat tulleet paria viikkoa aiemmin, tilanne olisi ollut toinen ja eristeet olisivat saattaneet kastua.

Katto teetettiin urakalla, ja jälkikäteen ajatellen ratkaisu oli erinomainen.

Porukka tuli sovittuna päivänä ja aikataulu piti prikulleen. Katto valmistui kahdessa viikossa ja kolmannella viikolla viimeisteltiin muun muassa jalkarännejä.

Sateet ja viileä sää ovat kiusanneet rehuntekoa. Toinen säilörehusato saatiin talteen vasta edellisviikolla ja pari hehtaaria jäi korjaamatta märkyyden takia. Rehu riittää, mutta kaadettu nurmi pitää saada pois kulottamasta uutta kasvua.

VEIKKO NIITTYMAA

Sikaloiden ja kanaloiden rakentamishalut lopahtivat

Investoinnit maidontuotantoon ja lihakarjaan jatkuvat viime vuoden tahdissa.

Maatalouden investointitukia haettiin elokuun puolivälissä päättyneellä vuoden kolmannella hakukierroksella 334 hankkeeseen.

Maaseutuviraston kokoaman yhteenvedon mukaan hakemusten määrä pysytteli likimain ennallaan.

Sikaloiden ja siipikarjatilojen ahdinko alkoi näkyä hakemusten määrässä jo toisella hakukierroksella helmi–maaliskuussa ja kolmannella kierroksella hakemusten määrä romahti.

Koko maassa jätettiin vain kolme pienehköä emakkosikalan laajentamista koskevaa investointitukihakemusta sekä yksi emakkosikalan ja lihasikalan tukihakemus. Lisäksi yksi broilerihalli tulee työn alle, mikäli elykeskus hyväksyy hakemukset.

Sika ja siipikarja neljäsosaan

Viiden hankkeen kustannusarviot ovat yhteensä 2,2 miljoonaa euroa, kun vastaavalla hakukierroksella vuosi sitten tuki myönnettiin yli 7,2 miljoonan euron hankkeille.

Ero on käytännössä vielä suurempi, sillä vireille tulleista hakemuksista karkeasti neljännes hylätään ja euroina hylkyyn menee vielä enemmän, liki 40 prosenttia hakemuksista.

Yleensä hakemuksia ei ehditä saada kuntoon kahden kuukauden määräajassa, jolloin hakijat siirtävät ne seuraavalle hakukierrokselle. Siirrot painottuvat isoihin hankkeisiin. Parhaimmillaan sama hakemus on tullut vireille neljästi ennen kuin se on hyväksytty.

Maatalousylitarkastaja **Kari Ojala** maaseutuvirastosta pitää kolmannen hakukierroksen antia aika tavanomaisena sikaloiden ja siipikirjahankkeiden määrää lukuunottamatta.

Maitotilat ja lihakarjan kasvattajat investoivat entiseen tapaan. Samoin kuivureita ja salaojituksia tuli vireille saman verran kuin vuosi sitten. Salaojituksissa ollaan jopa hieman edellä viime vuotta.

Tilanne ei yllätä hallintoa, sillä sikalat ja siipikarjatilat ovat olleet taloudelliset ahtaalla jo pitkään ja kriisi on syventynyt tänä vuonna.

Eläinmäärän lisäyslupa vesittyy

Sikaloiden ja siipikirjan investointitukien tilanne on ristiriitainen, sillä Suomi sai EU:lta luvan rahoittaa 33 000 eläinpaikan lisäystä yksimahaisten tuotannossa.

Lupa koskee julkisesti rahoitettavia sikala- ja siipikarjainvestointeja.

Tämän vuoden kolmen ensimmäisen hakukierroksen aikana potista on käytetty ehkä 2 000 eläinpaikkaa.

Ojalan mukaan jo nyt on selvää, ettei eläinpaikkojen lisäyslupa täyty eikä hakemuksia jouduta eläinpaikkarajoitteen takia hylkäämään, hyvä jos edes kymmenesosa pystytään käyttämään ensimmäisenä vuonna.

Vuoden neljäs investointitukien hakukierros käynnistyi maanantaina ja hakupapereita otetaan vastaan 19. lokakuuta saakka.

Elykeskuksilla on sen jälkeen kaksi kuukautta aikaa käsitellä vireille tulleet hakemukset loppuun.

VEIKKO NIITTYMAA

Investointien julkinen rahoitus 2011–12
Kumulatiivinen kertymä vuoden alusta, miljoonaa euroa

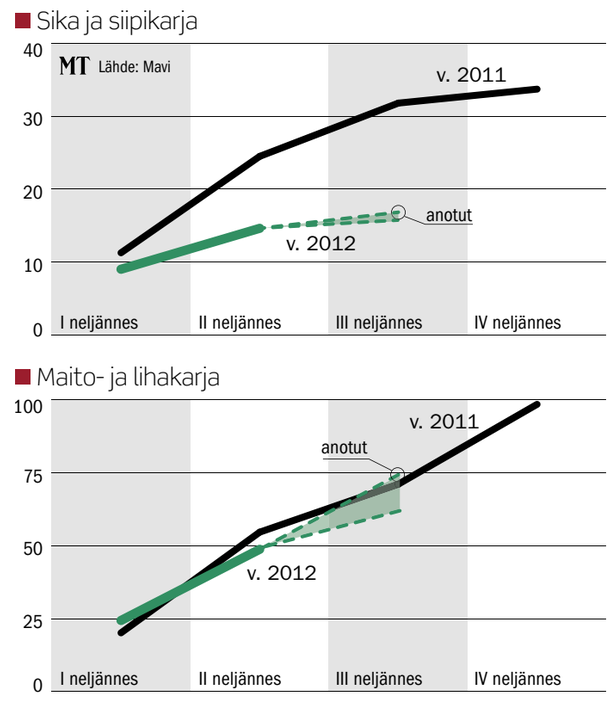

Salaojitusten julkinen rahoitus 2011–12
Kumulatiivinen kertymä vuoden alusta, miljoonaa euroa

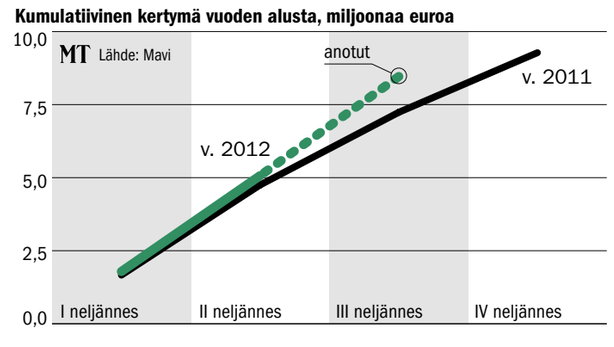

» Maitotilat ja lihakarjan kasvattajat investoivat entiseen tapaan. Samoin kuivureita ja salaojituksia tuli vireille saman verran kuin vuosi sitten.

» Koko maassa jätettiin vain kolme pienehköä emakkosikalan laajentamista koskevaa investointitukihakemusta sekä yksi emakkosikalan ja lihasikalan tukihakemus.
